



"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

Dependencia: Tesorería Municipal
Num. de TM/196/2018
Oficio: SIAVAMEN.
Expediente Se Remite Informe.
Asunto:

A/R

Villa Guerrero Méx., noviembre 16 de 2018.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2017 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle el reporte del FISM y FORTAMUN ejercicio 2018 del periodo comprendido de 01 al 31 de octubre de 2018.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



c.c.p.- Archivo Minutario
MAGR/miam.

Facebook: villaguertero
Twitter: villaguerteromx
Email: contacto@villaguertero.gob.mx

Plaza Morelos, esquina 5 de Mayo, Villa Guerrero, Estado de México, CP 51760
(0774) 14 6 0132
villaguertero.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18835/000133590	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONEXION VEHICULAR ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES DE MATLAZINCA Y TEQUIMILPA / MATLAZINCA	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-30	270,000.00	270,000.00	0.00	257,865.90	257,865.90	0.00	02 METRO CUADRADO	54.00		3 POBLADO	2	591	94	95.5
18837/000233607	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ROBLES / MATLAZINCA	CONTRATO	2018-04-02	2018-04-30	400,000.00	400,000.00	0.00	392,194.06	392,194.06	0.00	02 METRO CUADRADO	360.00		3 POBLADO	100	417	97	98.0
18838/000333630	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	899,764.01	899,764.01	0.00	02 METRO CUADRADO	468.00		5 ALUMNO	300	417	98	99.91
18839/000433636	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMO VERDAD / CARMEN, EL	CONTRATO	2018-04-23	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	899,795.96	899,795.96	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		5 ALUMNO	300	755	99	99.96
18840/000533660	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ / IZOTE, EL	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-01	900,000.00	900,000.00	0.00	899,781.66	899,781.66	0.00	02 METRO CUADRADO	323.00		5 ALUMNO	300	850	100	99.96
18841/000633671	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL PANTEON / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-04-02	2018-04-30	825,000.00	825,000.00	0.00	743,042.41	743,042.41	0.00	01 METRO LINEAL	438.00		3 POBLADO	1	623	89	90.06
18844/000633737	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LA ESCUELA VIEJA TERCERA ETAPA / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	416,650.00	416,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		3 POBLADO	1	1,463	0	0.00
19058/000934587	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD (2ª ETAPA) / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,849,859.95	2,849,859.95	0.00	01 METRO LINEAL	2,970.00		3 POBLADO	5,000	2,965	94	94.99
19522/001240653	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA ESCUELA VIEJA / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-06-01	2018-06-30	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLADO	1	1,463	0	0.00
19525/001340785	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	349,705.20	349,705.20	0.00	01 METRO LINEAL	4,301.00		3 POBLADO	1	2,450	100	99.92
19529/001440797	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	350	254	0	0.00
19531/001541592	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / CUAJIMALPA (LOS CUERVOS)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
19744/001656453	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	65	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
19746/001856635	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
19747/001956762	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	346,904.93	346,904.93	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	94	95.04
19748/002063891	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO / PEÑON, EL	CONTRATO	2018-05-21	2018-07-21	511,000.00	511,000.00	0.00	457,687.36	457,687.36	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIA	7	50	89	89.57
19749/002164002	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	116.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
19750/002265543	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2018-03-02	2018-05-30	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,386,929.11	1,386,929.11	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		7 FAMILIA	20	100	95	95.00
19751/002365807	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	327,178.96	327,178.96	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	89	89.64
19752/002467662	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	726,382.58	726,382.58	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		7 FAMILIA	10	50	99	99.77
19753/002567758	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	102.00		7 FAMILIA	8	114	0	0.00
19884/002673595	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,457,000.00	1,457,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		7 FAMILIA	20	100	98	99.79
19886/002775422	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION LEON GUZMAN / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	400,000.00	400,000.00	0.00	322,533.45	322,533.45	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	550	550	79	80.64
19906/002875932	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE POLIDUCTO REFORZADO DE CUATRO PULGADAS PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	100,000.00	100,000.00	0.00	99,913.12	99,913.12	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	1	3,566	100	99.91
19907/002976072	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA GARCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	330,000.00	330,000.00	0.00	329,789.62	329,789.62	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		3 POBLADO	1	9,509	99	99.93
19908/003076132	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALMADA Y MATAMOROS / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-15	2018-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	498,940.37	498,940.37	0.00	01 METRO LINEAL	638.00		2 COLONIA	1	9,509	98	99.79
19909/003176161	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-01	400,000.00	400,000.00	0.00	399,937.76	399,937.76	0.00	01 METRO LINEAL	276.00		2 COLONIA	1	8,502	99	99.98
20484/0032105809	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-06-01	2018-07-01	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	8,502	50	50.00
20485/0033106216	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	548.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00



Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20486/0034106460	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-02	500,000.00	500,000.00	0.00	450,602.57	450,602.57	0.00	01 METRO LINEAL	638.62		2 COLONIA	1	9,509	89	90.12
20490/0036109073	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / ZACANGO	CONTRATO	2018-08-01	2018-08-15	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	3,586	100	100.00
20491/0037109870	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 355 'SEBASTIAN LERDO DE TEJADA' / CARMEN, EL	CONTRATO	2018-04-25	2018-07-02	410,000.00	410,000.00	0.00	278,603.27	278,603.27	0.00	02 METRO CUADRADO	71.18		5 ALUMNO	1	854	67	67.95
20493/0038109975	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA GARCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-30	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20496/0039110108	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	310,288.24	310,288.24	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		2 COLONIA	1	9,509	88	88.66
20497/0040110215	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO PANTEON MUNICIPAL / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-05-01	2018-06-30	500,000.00	500,000.00	0.00	450,858.91	450,858.91	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		2 COLONIA	1	9,509	89	90.17
20693/0041150244	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-26	761,568.00	761,568.00	0.00	380,782.15	380,782.15	0.00	01 METRO LINEAL	9.00		3 POBLADO	1	1,010	50	50.00
20694/0042150312	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	600,245.00	600,245.00	0.00	597,050.56	597,050.56	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		3 POBLADO	1	3,853	98	99.46
20696/0044150363	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20697/0045150420	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO (3ª ETAPA) / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-19	2018-05-18	2,555,346.00	2,555,346.00	0.00	2,550,088.81	2,550,088.81	0.00	01 METRO LINEAL	1,485.00		3 POBLADO	1	3,586	98	99.79
20698/0046150841	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OVIEDO OESTE SEGUNDA ETAPA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	180,465.00	180,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	145.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20699/0047150732	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-01	2018-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20700/0048150778	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PASCUAL FRANCO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	200,000.00	200,000.00	0.00	149,511.89	149,511.89	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		2 COLONIA	1	9,509	74	74.76
20701/0049150849	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA GALEANA BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-06-09	183,136.00	183,136.00	0.00	164,794.33	164,794.33	0.00	01 METRO LINEAL	88.00		2 COLONIA	1	9,509	89	89.96
21692/0050188151	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE JUÁREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-06-01	2018-07-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	550.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
21893/0051/200808	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / RANCHOS DE SAN JOSE LOS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		3 POBLADO	1	2,660	0	0.00	
21894/0052/200834	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,973.29	999,973.29	0.00	01 METRO LINEAL	567.48		3 POBLADO	1	2,378	100	99.99	
21895/0053/200956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-08-06	2018-08-30	500,000.00	500,000.00	0.00	494,029.37	494,029.37	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	6,502	98	98.80	
21897/0054/205118	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (SEGUNDA ETAPA) / RANCHOS DE SAN JOSE LOS	CONTRATO	2018-05-04	2018-06-02	146,000.00	146,000.00	0.00	122,047.45	122,047.45	0.00	02 METRO CUADRADO	40.00		7 FAMILIA	2	10	83	63.59	
21898/0055/207436	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2018-05-04	2018-06-02	219,000.00	219,000.00	0.00	181,185.22	181,185.22	0.00	02 METRO CUADRADO	60.00		7 FAMILIA	3	15	62	82.73	
21900/0056/207779	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2018-05-15	2018-06-02	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	90.00		7 FAMILIA	3	15	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 50									TOTAL	26,205,410.00	26,205,410.00	57,022.47	26,957,022.47	0.00									3065

Presidencia Municipal
Complementarios: 11
Directa: 39
2016 2018
G. PITO MAYA DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.

TESORERIA
2016 2018
E.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.


OBRAS PUBLICAS
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.
ARQ. IGNACIO ROGEL CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA MUNICIPAL
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.
ING. JOSE ITURBE FUENTES
CONTADOR INTERNO

MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
22 NOV 2018
NORMATIVIDAD

Entidad	Municipio	Programa	Año de Registro	Clave de Recurso	Descripción del Recurso	Ramo	Clave de Descripción	Programa	Clave de Programa	Convenio	Entidad Ejecutora	Financiamiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Cantidad (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
México	Villa Guerrero	Programa pre	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de					3209.22	0			Total del Prog	43281913.98	43281913.98	32461435.49	43281913.98	26612660.87	26612660.87	26612660.87			N/A	N/A	Validado	
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 141 - Aportac	11100000	11100000	8325000	11100000	2939193	2939193	2939193	2939193	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 132 - Primas c	310000	310000	232500	310000	141072.43	141072.43	141072.43	141072.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 122 - Sueldos	6250000	6250000	4687500	6250000	4297212.21	4297212.21	4297212.21	4297212.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 991 - ADEFAS	4210000	4210000	3157500	4210000	4206704.06	4206704.06	4206704.06	4206704.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 569 - Otros ec	141636	141636	106227	141636	141636	141636	141636	141636	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 358 - Servici	7111913.98	7111913.98	5333935.49	7111913.98	4746711.16	4746711.16	4746711.16	4746711.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 313 - Agua	358364	358364	268773	358364	250350.03	250350.03	250350.03	250350.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 311 - Energía	6720000	6720000	5040000	6720000	4454265.44	4454265.44	4454265.44	4454265.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 296 - Refaccio	2600000	2600000	1950000	2600000	2075516.54	2075516.54	2075516.54	2075516.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		
México	Villa Guerrero	Partida genéri	2018	FEDERALES (A Aportaciones	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de							2 - Gasto de lr 261 - Combust	4480000	4480000	3360000	4480000	3360000	3360000	3360000	3360000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A		

Preliminar



"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

Dependencia: Tesorería Municipal
Num. de Oficio: TM/228/2018
Expediente: SIAVAMEN.
Asunto: Se Remite Informe.


Villa Guerrero Méx., diciembre 31 de 2018.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2017 (No presentarán Movimientos), así mismo me permito remitirle el reporte del FISM y FORTAMUNDF ejercicio 2018 del periodo comprendido de 01 al 30 de noviembre de 2018.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE.
Maria Angeles Gonzalez Rodriguez
L.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



c.c.p. - Archivo Minutario
MAGR/mean

VillaGuerreroMunicipio
villaguerrero
presidencia@villaguerrero.gob.mx

Plaza Morelos esquina 5 de Mayo, sin número, C.P. 51760, Villa Guerrero, Estado de México
(714) 14 60006, 1461476
www.villaguerrero.gob.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18835/000133590	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUNTES	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONEXION VEHICULAR ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES DE MATLAZINCA Y TEQUIMILPA / MATLAZINCA	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-30	270,000.00	270,000.00	0.00	269,892.99	269,892.99	0.00	02 METRO CUADRA	54.00		3 POBLADO	2	591	99	99.9
18837/000233607	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS ROBLES / MATLAZINCA	CONTRATO	2018-04-02	2018-04-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,776.89	399,776.89	0.00	02 METRO CUADRA	360.00		3 POBLADO	100	417	99	99.9
18838/000333630	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	899,764.01	899,764.01	0.00	02 METRO CUADRA	468.00		5 ALUMNO	300	417	98	99.9
18839/000433636	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMO VERDAD / CARMEN, EL	CONTRATO	2018-04-23	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	899,795.96	899,795.96	0.00	02 METRO CUADRA	500.00		5 ALUMNO	300	755	99	99.98
18840/000533660	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ / IZOTE, EL	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-01	900,000.00	900,000.00	0.00	899,781.66	899,781.66	0.00	02 METRO CUADRA	323.00		5 ALUMNO	300	850	100	99.98
18841/000533671	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL PANTEON / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-04-02	2018-04-30	825,000.00	825,000.00	0.00	743,042.41	743,042.41	0.00	01 METRO LINEAL	435.00		3 POBLADO	1	623	89	90.06
18844/000833737	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LA ESCUELA VIEJA TERCERA ETAPA / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	416,650.00	416,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		3 POBLADO	1	1,463	0	0.00
19058/000934587	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD (2ª ETAPA) / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,849,859.95	2,849,859.95	0.00	01 METRO LINEAL	2,970.00		3 POBLADO	5,000	2,965	94	94.99
19522/001240653	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA ESCUELA VIEJA / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-06-01	2018-06-30	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLADO	1	1,463	0	0.00
19525/001340785	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	349,705.20	349,705.20	0.00	01 METRO LINEAL	4,301.00		3 POBLADO	1	2,450	100	99.92
19529/001440797	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	410,000.00	410,000.00	0.00	409,664.71	409,664.71	0.00	02 METRO CUADRA	48.00		5 ALUMNO	350	254	99	99.97
19744/001656453	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA	80.00		7 FAMILIA	5	65	0	0.00
19746/001856635	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA	80.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00

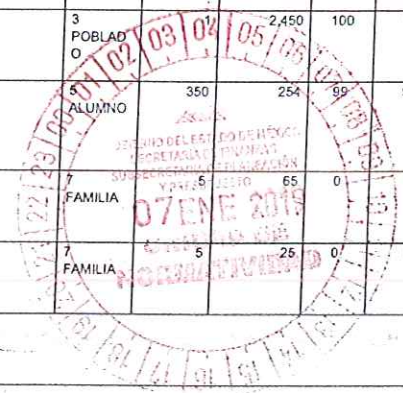



REPORTE DE AVANCE RAMO 3
 Registro de Avances Físicos y Financiero
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
19747/001956762	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	364,780.01	364,780.01	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	99	99.9
19748/002063891	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO / PEÑON, EL	CONTRATO	2018-05-21	2018-07-21	511,000.00	511,000.00	0.00	457,687.36	457,687.36	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIA	7	50	89	89.5
19749/002164002	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	116.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.0
19750/002265543	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2018-03-02	2018-05-30	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,386,929.11	1,386,929.11	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		7 FAMILIA	20	100	95	95.00
19751/002365807	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	327,178.96	327,178.96	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	89	89.64
19752/002467662	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	728,382.58	728,382.58	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		7 FAMILIA	10	50	99	99.77
19753/002567758	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	102.00		7 FAMILIA	8	114	0	0.00
19884/002673595	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,457,000.00	1,457,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		7 FAMILIA	20	100	98	99.79
19886/002775422	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION LEON GUZMAN / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	400,000.00	400,000.00	0.00	322,533.45	322,533.45	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	550	550	79	80.64
19906/002875932	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE POLIDUCTO REFORZADO DE CUATRO PULGADAS PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-30	100,000.00	100,000.00	0.00	99,913.12	99,913.12	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	1	3,586	100	99.91
19907/002976072	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA GARCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	330,000.00	330,000.00	0.00	329,789.62	329,789.62	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		3 POBLADO	1	9,509	99	99.93
19908/003076132	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALMADA Y MATAMOROS / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-15	2018-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	498,940.37	498,940.37	0.00	01 METRO LINEAL	638.00		2 COLONIA	1	9,509	98	99.79
19909/003176161	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-01	400,000.00	400,000.00	0.00	399,937.76	399,937.76	0.00	01 METRO LINEAL	276.00		2 COLONIA	1	9,502	99	99.98
20484/0032105809	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-06-01	2018-07-01	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	8,502	50	50.00
20485/0033106216	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	548.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20486/0034106460	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-02	500,000.00	500,000.00	0.00	450,602.57	450,602.57	0.00	01 METRO LINEAL	638.62		2 COLONIA	1	9,509	89	90.12



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod:Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U: Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U: Personas	Fis.	Fin
20490/0036 109073	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / ZACANGO	CONTRATO	2018-08-01	2018-08-15	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	3,566	100	100
20491/0037 109870	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 355 SEBASTIAN LERDO DE TEJADA? / CARMEN, EL	CONTRATO	2018-04-25	2018-07-02	410,000.00	410,000.00	0.00	278,603.27	278,603.27	0.00	02 METRO CUADRADO	71.18		5 ALUMNO	1	854	67	67
20493/0038 109975	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ MARÍA GARCÍA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-30	70,000.00	70,000.00	0.00	69,943.70	69,943.70	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		2 COLONIA	1	9,509	99	99.1
20496/0039 110108	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	310,288.24	310,288.24	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		2 COLONIA	1	9,509	88	88.6
20497/0040 110215	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO PANTEON MUNICIPAL / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-05-01	2018-06-30	500,000.00	500,000.00	0.00	494,795.26	494,795.26	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		2 COLONIA	1	9,509	98	98.9
20693/0041 150244	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-04-03 2018-04-27	2018-05-30 2018-05-26	761,568.00	761,568.00	0.00	380,782.15	380,782.15	0.00	01 METRO LINEAL	9.00		3 POBLADO	1	1,010	50	50.0
20694/0042 150312	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD / SANTIAGO OXTOTITLÁN	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	600,245.00	600,245.00	0.00	599,952.36	599,952.36	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		3 POBLADO	1	3,853	99	99.9
20696/0044 150363	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20697/0045 150420	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO (3ª ETAPA) / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-19	2018-05-18	2,555,346.00	2,555,346.00	0.00	2,550,088.81	2,550,088.81	0.00	01 METRO LINEAL	1,485.00		3 POBLADO	1	3,566	98	99.79
20698/0046 150641	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OVIEDO OESTE SEGUNDA ETAPA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	180,465.00	180,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	145.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20699/0047 150732	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-01	2018-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20700/0048 150778	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PASCUAL FRANCO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	200,000.00	200,000.00	0.00	164,473.66	164,473.66	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		2 COLONIA	1	9,509	82	82.24
20701/0049 150849	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA GALEANA BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20 2018-04-11	2018-07-20 2018-06-09	183,136.00	183,136.00	0.00	183,135.70	183,135.70	0.00	01 METRO LINEAL	88.00		2 COLONIA	1	9,509	99	100.00
21892/0050 186151	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE JUÁREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-06-01	2018-07-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	550.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
21893/0051 200808	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		3 POBLADO	1	2,660	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R-del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
21894/0052 200834	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-06-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,973.29	999,973.29	0.00	01 METRO LINEAL	567.48		3 POBLADO	1	2,378	100	99.1	
21896/0053 200956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-08-06	2018-08-30	500,000.00	500,000.00	0.00	494,029.37	494,029.37	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	8,502	98	98.1	
21897/0054 205118	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (SEGUNDA ETAPA) / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-05-04	2018-06-02	146,000.00	146,000.00	0.00	145,999.45	145,999.45	0.00	02 METRO CUADRADO	40.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.0	
21898/0055 207436	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2018-05-04	2018-05-02	219,000.00	219,000.00	0.00	218,999.17	218,999.17	0.00	02 METRO CUADRADO	60.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.0	
21900/0056 207779	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2018-05-15	2018-06-02	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	90.00		7 FAMILIA	3	15	0	0.00	
24799/0057 373983	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-11-03	2018-11-23	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	100.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 50									28,205,410.00	28,205,410.00	0.00	21,616,223.12	21,616,223.12	0.00								3338	

Complementarios: 11 Directa: 39

C. Tito Maya de la Cruz
C. TITO MAYA DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.A. Maria Angeles Gonzalez Rodriguez
L.A. MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

Arq. Ignacio Rogel Cruz
ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

Ing. Jose Iturbe Fuentes
ING. JOSE ITURBE
FUENTES
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL



Dependencia: Tesorería Municipal
Num. de TM/231/2018
Oficio: SIAVAMEN.
Expediente Se Remite Informe.
Asunto:

Villa Guerrero Méx., enero 11 de 2019.

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2017 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle el reporte del FISM y FORTAMUNDF ejercicio 2018 del periodo comprendido de 01 al 31 de diciembre de 2018.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



Maria Angeles Gonzalez Rodriguez
MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERÓ ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18835/ 0001 33590	17 URB	UR URBANIZACI N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONEXIÓN VEHICULAR ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES DE MATLAZINCA Y TEQUIMILPA / MATLAZINCA	CONTRAT O	2018-04-02	2018-05-30	270,000.00	270,000.00	0.00	269,892.99	269,892.99	0.00	02 METRO C UADRADO	54.00		3 POBLADO	2	591	99	99.95
18837/ 0002 33607	17 URB	UR URBANIZACI N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ROBLES / MATLAZINCA	CONTRAT O	2018-04-02	2018-04-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,776.89	399,776.89	0.00	02 METRO C UADRADO	360.00		3 POBLADO	100	417	99	99.95
18838/ 0003 33630	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	899,764.01	899,764.01	0.00	02 METRO C UADRADO	468.00		5 ALUMNO	300	417	98	99.97
18839/ 0004 33636	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMO VERDAD / CARMEN, EL	CONTRAT O	2018-04-23	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	899,795.96	899,795.96	0.00	02 METRO C UADRADO	500.00		5 ALUMNO	300	755	99	99.98
18840/ 0005 33660	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ / IZOTE, EL	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-01	900,000.00	900,000.00	0.00	899,781.66	899,781.66	0.00	02 METRO C UADRADO	323.00		5 ALUMNO	300	650	100	99.98
18841/ 0006 33671	17 URB	UR URBANIZACI N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL PANTEÓN / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-04-30	825,000.00	825,000.00	0.00	824,991.76	824,991.76	0.00	01 METRO LINEAL	438.00		3 POBLADO	1	623	98	99.99
18844/ 0008 33737	15 AYS	13 ALCANTAR ILLADO	A CONSTRU CION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE LA ESCUELA VIEJA TERCERA ETAPA / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-05-30	416,650.00	416,650.00	0.00	416,439.03	416,439.03	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		3 POBLADO	1	1,463	99	99.95
19058/ 0009 34587	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRU CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD (2ª ETAPA) / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,698.72	2,999,698.72	0.00	01 METRO LINEAL	2,970.00		3 POBLADO	5,000	2,965	99	99.98
19522/ 0012 40553	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRU CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA ESCUELA VIEJA / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-06-01	2018-06-30	160,000.00	160,000.00	0.00	159,813.81	159,813.81	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLADO	1	1,463	100	99.88
19525/ 0013 40765	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRAT O	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	349,705.20	349,705.20	0.00	01 METRO LINEAL	4,301.00		3 POBLADO	1	2,450	100	99.92
19529/ 0014 40797	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	410,000.00	410,000.00	0.00	409,864.71	409,864.71	0.00	02 METRO C UADRADO	48.00		5 ALUMNO	350	254	99	99.97
19744/ 0016 56453	18 VIV	MY MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRU CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	364,995.36	364,995.36	0.00	02 METRO C UADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	65	100	100.00
19746/ 0018 56635	18 VIV	MY MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRU CION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRAT O	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	364,771.67	364,771.67	0.00	02 METRO C UADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	100	99.94

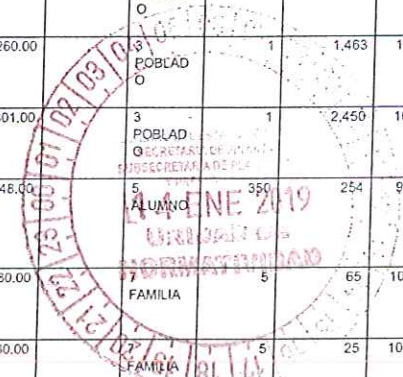



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
19747/001956762	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	364,760.01	364,760.01	0.00	02 METRO CUADRAO	60.00		7 FAMILIA	5	25	99	99.94
19748/002063891	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO / PEÑON, EL	CONTRATO	2018-05-21	2018-07-21	511,000.00	511,000.00	0.00	510,213.04	510,213.04	0.00	02 METRO CUADRAO	112.00		7 FAMILIA	7	50	100	99.85
19749/002164002	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	729,995.53	729,995.53	0.00	02 METRO CUADRAO	116.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
19750/002265543	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2018-03-02	2018-05-30	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	02 METRO CUADRAO	320.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
19751/002365807	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	364,727.23	364,727.23	0.00	02 METRO CUADRAO	80.00		7 FAMILIA	5	25	99	99.93
19752/002467662	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	728,382.58	728,382.58	0.00	02 METRO CUADRAO	160.00		7 FAMILIA	10	50	99	99.77
19753/002567758	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	584,000.00	584,000.00	0.00	583,817.82	583,817.82	0.00	02 METRO CUADRAO	102.00		7 FAMILIA	8	114	100	99.97
19884/002673595	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,457,000.00	1,457,000.00	0.00	02 METRO CUADRAO	320.00		7 FAMILIA	20	100	98	99.79
19886/002775422	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION LEON GUZMAN / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	400,000.00	400,000.00	0.00	399,657.80	399,657.80	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	550	550	99	99.92
19906/002875932	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE POLIDUCTO REFORZADO DE CUATRO PULGADAS PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-30	100,000.00	100,000.00	0.00	99,913.12	99,913.12	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	1	3,588	100	99.91
19907/002976072	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA GARCIA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	330,000.00	330,000.00	0.00	329,789.62	329,789.62	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		3 POBLADO	1	9,509	99	99.93
19908/003076132	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALMADA Y MATAMOROS / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-15	2018-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	498,940.37	498,940.37	0.00	01 METRO LINEAL	638.00		2 COLONIA	1	9,509	98	99.79
19909/003176161	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-01	400,000.00	400,000.00	0.00	399,937.76	399,937.76	0.00	01 METRO LINEAL	276.00		2 COLONIA	1	9,502	99	99.98
20484/0032105809	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-06-01	2018-07-01	200,000.00	200,000.00	0.00	199,999.99	199,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	8,602	100	100.00
20485/0033106216	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	400,000.00	400,000.00	0.00	399,971.71	399,971.71	0.00	01 METRO LINEAL	548.00		2 COLONIA	1	9,509	100	99.99
20486/0034106460	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-02	500,000.00	500,000.00	0.00	498,940.37	498,940.37	0.00	01 METRO LINEAL	638.00		2 COLONIA	1	9,509	99	99.79

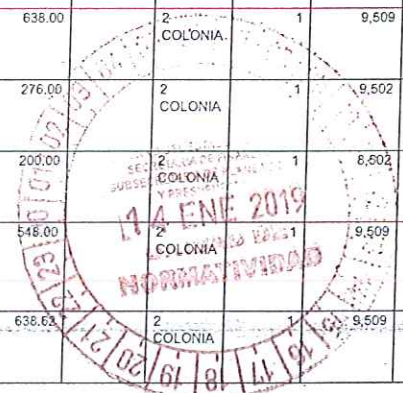



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20490/ 0036 109073	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / ZACANGO	CONTRATO	2018-08-01	2018-08-15	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	3,566	100	100.00
20491/ 0037 109870	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 355 ?SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA? / CARMEN, EL	CONTRATO	2018-04-25	2018-07-02	410,000.00	410,000.00	0.00	409,821.34	409,821.34	0.00	02 METRO CUADRO	71.18		5 ALUMNO	1	854	99	99.95
20493/ 0038 109975	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ MARÍA GARCÍA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-30	70,000.00	70,000.00	0.00	69,943.70	69,943.70	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		2 COLONIA	1	9,509	99	99.92
20496/ 0039 110108	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	349,950.02	349,950.02	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		2 COLONIA	1	9,509	100	99.99
20497/ 0040 110215	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO PANTEÓN MUNICIPAL / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-05-01	2018-06-30	500,000.00	500,000.00	0.00	494,795.26	494,795.26	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		2 COLONIA	1	9,509	98	98.96
20693/ 0041 150244	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-04-03 2018-04-27	2018-05-30 2018-05-26	761,568.00	761,568.00	0.00	761,564.32	761,564.32	0.00	01 METRO LINEAL	9.00		3 POBLADO	1	1,010	100	100.00
20694/ 0042 150312	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	600,245.00	600,245.00	0.00	599,952.36	599,952.36	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		3 POBLADO	1	3,853	99	99.94
20696/ 0044 150363	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	369,000.00	369,000.00	0.00	368,985.10	368,985.10	0.00	01 METRO LINEAL	125.00		2 COLONIA	1	9,509	100	100.00
20697/ 0045 150420	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO (3ª ETAPA) / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-19	2018-05-18	2,555,346.00	2,555,346.00	0.00	2,550,088.81	2,550,088.81	0.00	01 METRO LINEAL	1,485.00		3 POBLADO	1	3,566	98	99.79
20698/ 0046 150641	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OVIEDO OESTE SEGUNDA ETAPA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	180,465.00	180,465.00	0.00	180,371.00	180,371.00	0.00	02 METRO CUADRO	145.00		2 COLONIA	1	9,509	100	99.95
20699/ 0047 150732	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-01	2018-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	299,912.76	299,912.76	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	1	9,509	100	99.97
20700/ 0048 150778	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PASCUAL FRANCO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	200,000.00	200,000.00	0.00	164,473.66	164,473.66	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		2 COLONIA	1	9,509	82	82.24
20701/ 0049 150849	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA GALEANA BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20 2018-04-11	2018-07-20 2018-06-09	183,136.00	183,136.00	0.00	183,135.70	183,135.70	0.00	01 METRO LINEAL	88.00		2 COLONIA	1	9,509	99	100.00
21892/ 0050 188151	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE JUÁREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-06-01	2018-07-30	300,000.00	300,000.00	0.00	299,988.95	299,988.95	0.00	65 KILOMETRO CUADRO	550.00		2 COLONIA	1	9,509	100	100.00
21893/ 0051 200808	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	600,000.00	600,000.00	0.00	599,828.09	599,828.09	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		3 POBLADO	1	2,860	100	99.97





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
21894/0052 200834	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-06-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,973.29	999,973.29	0.00	01 METRO LINEAL	587.48		3 POBLADO	1	2,378	100	99.99	
21896/0053 200956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-08-06	2018-08-30	500,000.00	500,000.00	0.00	499,999.99	499,999.99	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	8,502	100	99.99	
21897/0054 205118	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (SEGUNDA ETAPA) / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-05-04	2018-06-02	146,000.00	146,000.00	0.00	145,999.45	145,999.45	0.00	02 METRO CUADRO	40.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00	
21898/0055 207436	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2018-05-04	2018-06-02	219,000.00	219,000.00	0.00	218,999.17	218,999.17	0.00	02 METRO CUADRO	60.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00	
21900/0056 207779	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO / SANTIAGO OXTOTILAN	CONTRATO	2018-05-15	2018-06-02	219,000.00	219,000.00	0.00	218,814.83	218,814.83	0.00	02 METRO CUADRO	90.00		7 FAMILIA	3	15	100	99.92	
24799/0057 373983	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-11-03	2018-11-23	365,000.00	365,000.00	0.00	364,803.05	364,803.05	0.00	02 METRO CUADRO	100.00		7 FAMILIA	5	25	100	99.95	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 50									TOTAL	26,205,410.00	28,205,410.00	0.00	28,146,759.57	28,146,759.57	0.00							4953	

Complementarios: 11 Directa: 39

C. TITO MAYA DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCION
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCION
VILLA GUERRERO, MEX.

L.A. MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLA GUERRERO, MEX.

ARQ. IGNACIO ROGEL
CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLA GUERRERO, MEX.

ING. JOSE ITURBE
FUENTES
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2016 2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VILLA GUERRERO, MEX.
