

“2018: AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE”

Dependencia: Tesorería Municipal  
Num. de Oficio: TM/152/2018  
Expediente: SIAVAMEN.  
Asunto: Se Remite Informe.


Villa Guerrero Méx., octubre 04 de 2018.

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
**DIRECTORA GENERAL DE INVERSION**  
**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**  
**P R E S E N T E .**


Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito informar a usted respecto al reporte de Avance Ramo 33 de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los años 2013 al 2017 (No presentan Movimientos), así mismo me permito remitirle el reporte del FISM y FORTAMUNDF ejercicio 2018 del periodo comprendido de 01 al 30 de septiembre de 2018.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.



*Maria Angeles Gonzalez Rodriguez*  
**MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**



c.c.p. - Archivo Minutario  
MAGRvntam.

VillaguerreroMunicipio  
villaguerrero  
presidencia@villaguerrero.gob.mx

Plaza Morelos esquina 5 de Mayo, sin número. C.P. 51760. Villa Guerrero, Estado de México  
(714)-14 60006, 1461476  
www.villaguerrero.gob.mx



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 43,281,913.98 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
16793/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 (PERCEPCIONES BRUTAS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	2,994,588.42	2,994,588.42	0.00	80 ELEMENTO	62.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	66	69.32
16848/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	700,000.00	700,000.00	0.00	228,743.46	228,743.46	0.00	80 ELEMENTO	62.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	32	32.68
16849/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	111,153.32	111,153.32	0.00	80 ELEMENTO	62.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	44	44.46
16850/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 (PERCEPCIONES BRUTAS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,030,417.18	1,030,417.18	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	92	93.67
16851/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE AGUINALDO BRUTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	130,000.00	130,000.00	0.00	43,463.15	43,463.15	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	33	33.43
16852/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL BRUTA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	60,000.00	60,000.00	0.00	29,919.11	29,919.11	0.00	80 ELEMENTO	20.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	49	49.87
16853/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QUINCENA DE ENERO A LA 2A. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	11,100,000.00	11,100,000.00	0.00	2,939,193.00	2,939,193.00	0.00	81 PAGO	398.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	25	26.48
16854/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00	4,454,265.44	4,454,265.44	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	64	66.28
16855/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	4,206,704.66	4,206,704.66	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	100	99.92
16856/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	678,160.54	678,160.54	0.00	55 EQUIPO	20.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	83	84.77
16857/0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	678,664.53	678,664.53	0.00	63 MAQUINARIA	6.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	85	87.87



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 43,281,913.98 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
16858/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	718,691.42	718,691.42	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	87	89.84	
16859/0013	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,462,500.00	1,462,500.00	0.00	50 EQUIPO	20.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	69	73.14	
16860/0014	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	460,000.00	460,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	0.00	63 MAQUINARIA	6.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	69	73.14	
16861/0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	50 EQUIPO	12.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	71	75.02	
16862/0016	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUCCION	076 RELLENO SANITARIO	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELLENO SANITARIO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-19	2018-12-31	7,111,913.98	7,111,913.98	0.00	4,746,711.16	4,746,711.16	0.00	03 METRO CUBICO	14,400.00		4 MUNICIPIO	1	59,991	65	66.74	
19323/0017	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, GAS Y CLORACION A LA COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-26	2018-12-31	358,364.00	358,364.00	0.00	250,350.03	250,350.03	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	59,990	69	69.65	
22002/0018	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	I EQUIPAMIENTO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CARCAMO AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-08-03	2018-08-06	141,636.00	141,636.00	0.00	141,636.00	141,636.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	9,509		100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 16									TOTAL	43,281,913.98	43,281,913.98	0.00	26,566,160.87	26,566,160.87	0.00							1172	

Complementarios: 0 Directa: 0

2016  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.  
2018  
MAYRA DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

2016  
TESORERIA  
L.A. MARIA ANGELES  
GONZALEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

2016  
OBRAS PUBLICAS  
IGNACIO ROGEL  
CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.

2016  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.  
2018  
JOSE ITURBE FUENTES  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
18835/ 0001 33590	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONEXIÓN VEHICULAR ENTRE LAS COMUNIDADES RURALES DE MATLAZINCA Y TEQUIMILPA / MATLAZINCA	CONTRAT O	2018-04-02	2018-05-30	270,000.00	270,000.00	0.00	253,212.57	253,212.57	0.00	02 METRO C UADRAD O	54.00		3 POBLAD O	2	591	93	93.78
18837/ 0002 33607	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ROBLES / MATLAZINCA	CONTRAT O	2018-04-02	2018-04-30	400,000.00	400,000.00	0.00	365,301.36	365,301.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	360.00		3 POBLAD O	100	417	96	96.33
18838/ 0003 33630	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	884,250.82	884,250.83	0.00	02 METRO C UADRAD O	468.00		5 ALUMNO	300	417	97	98.25
18839/ 0004 33636	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMO VERDAD / CARMEN, EL	CONTRAT O	2018-04-23	2018-05-30	900,000.00	900,000.00	0.00	869,485.26	869,485.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	500.00		5 ALUMNO	300	755	96	96.61
18840/ 0005 33660	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ / IZOTE, EL	CONTRAT O	2018-04-01	2018-05-01	900,000.00	900,000.00	0.00	819,364.29	819,364.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	323.00		5 ALUMNO	300	850	91	91.04
18841/ 0006 33671	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL PANTEÓN / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-04-30	825,000.00	825,000.00	0.00	730,231.33	730,231.33	0.00	01 METRO LINEAL	438.00		3 POBLAD O	1	623	83	88.51
18844/ 0008 33737	15 AYS	13 ALCANTAR RILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE A LCANTARILLA DO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE LA ESCUELA VIEJA TERCERA ETAPA / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-05-30	416,650.00	416,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		3 POBLAD O	1	1,463	0	0.00
19058/ 0009 34587	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD (2ª ETAPA) / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-01	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,803,307.66	2,803,307.66	0.00	01 METRO LINEAL	2,970.00		3 POBLAD O	5,000	2,965	93	93.44
19522/ 0012 40653	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA ESCUELA VIEJA / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-06-01	2018-06-30	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		3 POBLAD O	1	1,463	0	0.00
19525/ 0013 40785	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRAT O	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	349,705.20	349,705.20	0.00	01 METRO LINEAL	4,301.00		3 POBLAD O	1	2,450	100	99.92
19529/ 0014 40797	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MINERVA / SAN DIEGO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	48.00		5 ALUMNO	350	254	0	0.00
19531/ 0015 41592	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / CUAJIMALPA (LOS CUERVOS)	CONTRAT O	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	80.00		7 FAMILIA	5	65	0	0.00
19744/ 0016 56453	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MATLAZINCA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	80.00		7 FAMILIA	5	65	0	0.00

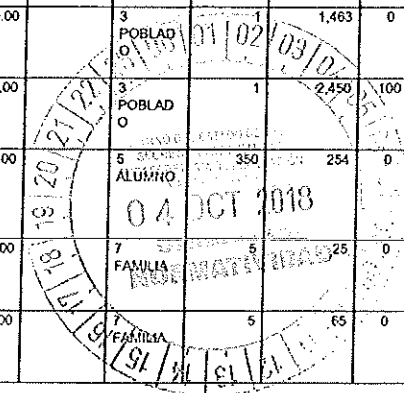




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y Acción							Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
19746/001856835	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
19747/001956762	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	340,923.81	340,923.81	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	93	93.40
19748/002063891	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO / PEÑON, EL	CONTRATO	2018-05-21	2018-07-21	511,000.00	511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	112.00		7 FAMILIA	7	50	0	0.00
19749/002164002	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / RANCHOS DE SAN JOSE. LOS	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	116.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
19750/002265543	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN MATEO COAPEXCO	CONTRATO	2018-03-02	2018-05-30	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		7 FAMILIA	20	100	50	50.00
19751/002365807	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO / POTRERO DE LA SIERRA	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
19752/002467052	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	730,000.00	730,000.00	0.00	642,352.40	642,352.40	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		7 FAMILIA	10	50	88	87.99
19753/002567758	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	102.00		7 FAMILIA	8	114	0	0.00
19834/002873595	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,431,879.31	1,431,879.31	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		7 FAMILIA	20	100	97	98.07
19886/002775422	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION LEON GUZMAN / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	400,000.00	400,000.00	0.00	316,972.53	316,972.53	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	550	550	78	79.25
19906/002875932	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE POLIDUCTO REFORZADO DE CUATRO PULGADAS PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-01	2018-03-30	100,000.00	100,000.00	0.00	99,913.12	99,913.12	0.00	01 METRO LINEAL	1,000.00		3 POBLADO	1	3,556	100	99.91
19907/002976072	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSÉ MARIA GARCÍA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-30	330,000.00	330,000.00	0.00	324,103.59	324,103.59	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		3 POBLADO	1	9,509	98	98.21
19908/003076132	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALMADA Y MATAMOROS / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-15	2018-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	490,337.95	490,337.95	0.00	01 METRO LINEAL	638.00		2 COLONIA	1	9,509	97	98.07
19909/003176161	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-01	400,000.00	400,000.00	0.00	393,042.28	393,042.28	0.00	01 METRO LINEAL	276.00		2 COLONIA	1	9,502	96	98.26
20484/0032105809	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-06-01	2018-07-01	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	8,502	50	50.00
20485/0033106216	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	548.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00

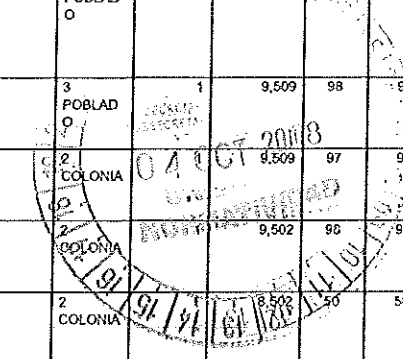



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros


(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Locafidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20486/0034 106460	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-02	500,000.00	500,000.00	0.00	443,190.74	443,190.74	0.00	01 METRO LINEAL	638.62		2 COLONIA	1	9,509	88	88.64
20490/0036 109073	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / ZACANGO	CONTRATO	2018-08-01	2018-08-15	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		3 POBLADO	1	3,586	0	0.00
20491/0037 109370	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	224 SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 355 7SEBASTIAN LERDO DE TEJADA? / CARMEN, EL	CONTRATO	2018-04-25	2018-07-02	410,000.00	410,000.00	0.00	273,799.77	273,799.77	0.00	02 METRO CUADRAD	71.18		5 ALUMNO	1	854	66	68.78
20493/0038 109975	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE JOSÉ MARÍA GARCÍA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-02	2018-05-30	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20496/0039 110108	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	350,000.00	350,000.00	0.00	304,938.44	304,938.44	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		2 COLONIA	1	9,509	87	87.13
20497/0040 110215	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO PANTEON MUNICIPAL / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-05-01	2018-06-30	500,000.00	500,000.00	0.00	443,085.48	443,085.48	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		2 COLONIA	1	9,509	88	88.62
20693/0041 150244	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD / PROGRESO HIDALGO, EL	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-28	761,568.00	761,568.00	0.00	360,782.15	360,782.15	0.00	01 METRO LINEAL	9.00		3 POBLADO	1	1,010	50	50.00
20694/0042 150312	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD / SANTIAGO OXTOITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	600,245.00	600,245.00	0.00	586,706.55	586,706.55	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		3 POBLADO	1	3,653	97	97.74
20695/0044 150363	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	188 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-03	2018-05-30	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20697/0045 150420	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ZACANGO (3ª ETAPA) / ZACANGO	CONTRATO	2018-04-19	2018-05-18	2,555,348.00	2,555,346.00	0.00	2,506,121.76	2,506,121.76	0.00	01 METRO LINEAL	1,485.00		3 POBLADO	1	3,658	97	98.07
20698/0046 150641	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OVIEDO OESTE SEGUNDA ETAPA / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-30	180,465.00	180,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	145.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20699/0047 150732	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-07-01	2018-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00
20700/0048 150778	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PASCUAL FRANCO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	200,000.00	200,000.00	0.00	146,934.10	146,934.10	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		2 COLONIA	1	9,509	73	73.47
20701/0049 150849	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA GALEANA BARRIO DE GUADALUPE / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-04-20	2018-07-20	183,136.00	183,136.00	0.00	161,953.05	161,953.05	0.00	01 METRO LINEAL	88.00		2 COLONIA	1	9,509	88	88.43
21892/0050 188151	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE JUÁREZ / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRAD	550.00		2 COLONIA	1	9,509	0	0.00

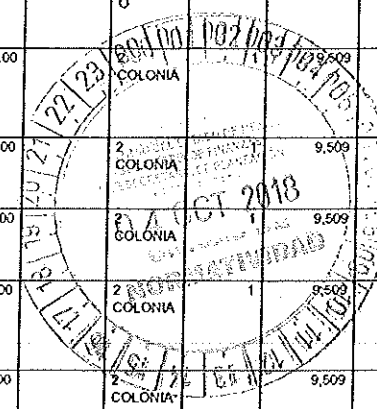



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 114 VILLA GUERRERO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,205,410.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Int. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Canidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
21893/0051 200808	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	35.00		3 POBLADO	1	2,660	0	0.00		
21894/0052 200834	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE / SAN BARTOLOME (SAN BARTOLO)	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	982,732.37	982,732.37	0.00	01 METRO LINEAL	587.48		3 POBLADO	1	2,378	99	98.27		
21896/0053 200956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO / VILLA GUERRERO	CONTRATO	2018-08-06	2018-08-30	500,000.00	500,000.00	0.00	485,511.62	485,511.62	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	8,502	97	97.10		
21897/0054 205118	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO (SEGUNDA ETAPA) / RANCHOS DE SAN JOSE, LOS	CONTRATO	2018-05-01	2018-06-02	148,000.00	148,000.00	0.00	119,943.18	119,943.18	0.00	02 METRO CUADRO	40.00		7 FAMILIA	2	10	82	82.15		
21898/0055 207436	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO / MORAL, EL	CONTRATO	2018-05-04	2018-06-02	219,000.00	219,000.00	0.00	177,409.37	177,409.37	0.00	02 METRO CUADRO	60.00		7 FAMILIA	3	15	81	81.01		
21900/0056 207779	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO / SANTIAGO OXTOTITLAN	CONTRATO	2018-05-15	2018-06-02	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	90.00		7 FAMILIA	3	15	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO EJERCICIO: 50									28,205,410.00	28,205,410.00	0.00	18,977,492.27	18,977,492.27	0.00									2698	

Complementarios: 11

Directa: 39

2016  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.  
C. FITO MAYA DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016  
TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.  
L.A. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

2016  
OBRAS PUBLICAS  
APOYADO POR ROSEL CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.

2016  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA GUERRERO, MEX.  
JOSE LUIS TORRE  
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL

04 OCT 2018  
NORMATIVIDAD
